



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РОСАВТОДОР
ФКУ УПРДОР «ЮЖНЫЙ БАЙКАЛ»

**Система контроля за реализацией национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

Подведомственная сеть автомобильных дорог ФКУ



Система управления ФКУ

ФКУ →



ОРИЕНТИРОВАНО
НА ДОСТИЖЕНИЕ



ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

* ПОСТАНОВЩИК -
РОСАВТОДОР

* ПОСТАНОВЩИК – ЛЮБОЙ
СОТРУДНИК ФКУ

ВКЛЮЧАЕТ ПРОЦЕССЫ

ОСНОВНЫЕ

- Формирование программы работ
- Проектирование
- Торги
- Контроль выполнения СМР
- Контроль за содержанием сети
(в т.ч. диспетчеризация и взаимодей. с ГИБДД)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ


- Юридический блок
- Земельные вопросы
- Бухгалтерия
- Совершенствование ГК
- Взаимодействие со СМИ
- Кадры (в т.ч. KPI и обучение)

ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗНАНИЯ

- Эффективные совещания
- KPI
- Матрица ответственности RASCL
- Диаграммы Гантта
- Аттестация
- Система нематериальной мотивации
- Цикл PDCA

Инструменты контроля деятельности ФКУ

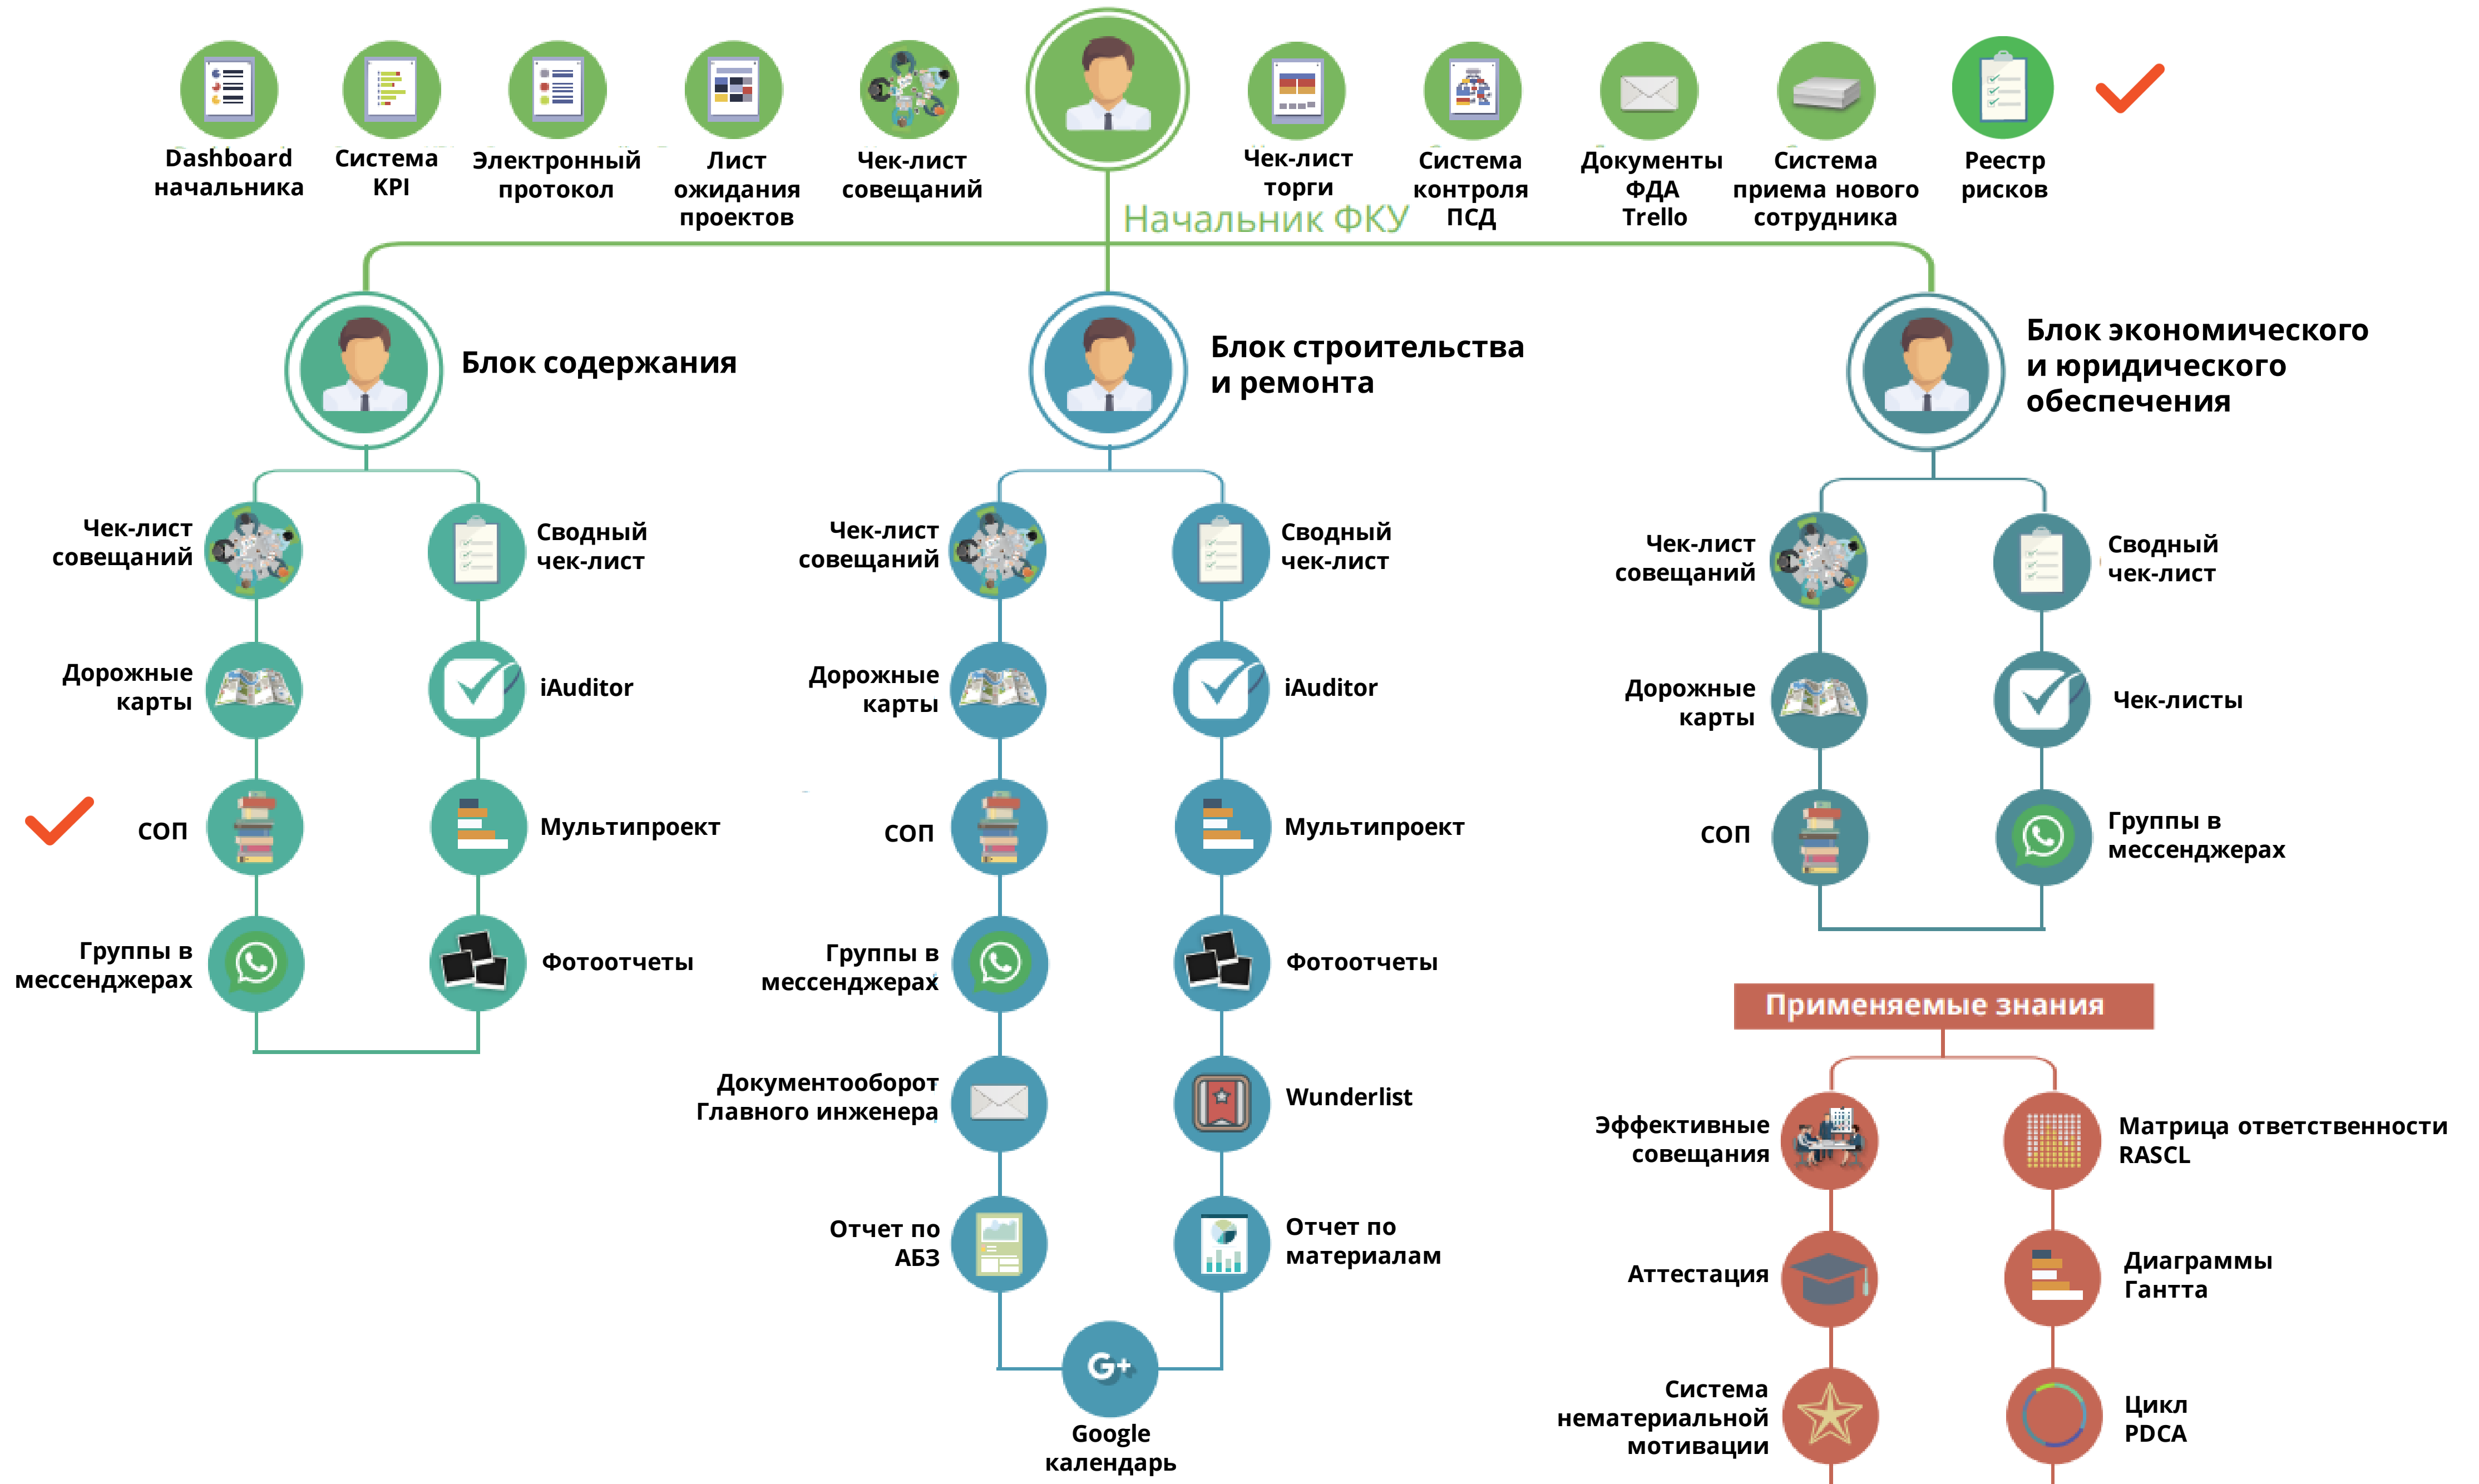

Реестр рисков отслеживаемых ФКУ



Кассовое
исполнение
(5 рисков)



Наличие ошибок в
проектной документации
(4 риска)



Кадровые риски
(6 рисков)



Юридические
риски
(4 риска)




Риски
подрядчиков
(8 рисков)




Форс-мажоры
(3 риска)

Управление рисками в процессе реализации проекта

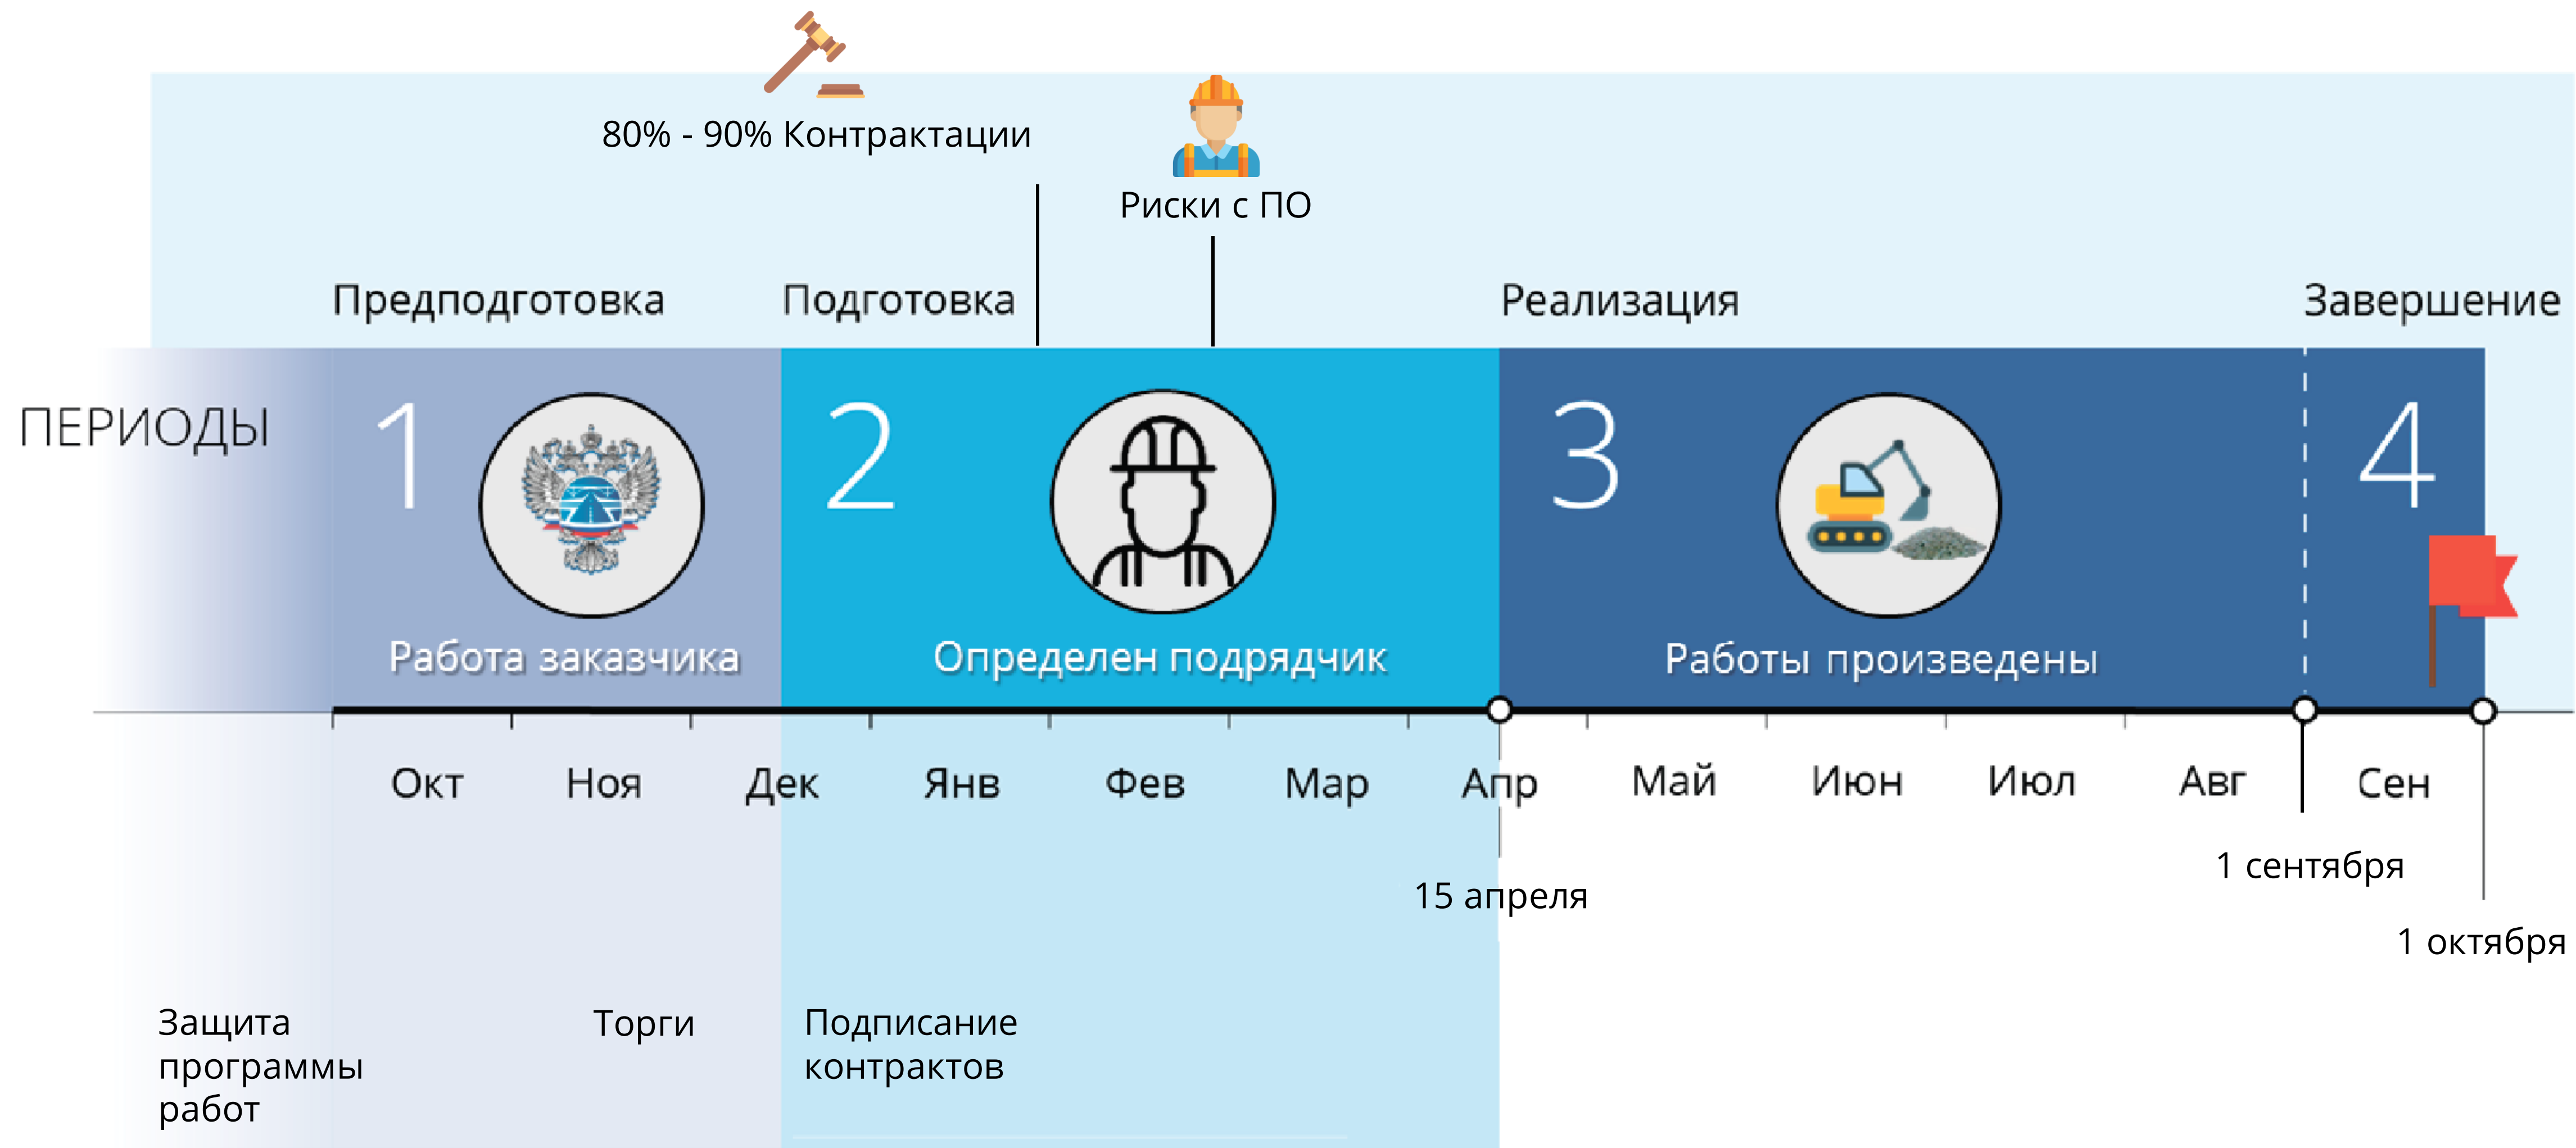

Управление рисками. Проверка готовности подрядных организаций к работе




Базы



Карьеры




АБЗ



Техника



Специалисты




Дробление

Мониторинг реализации проектов



Инфографика

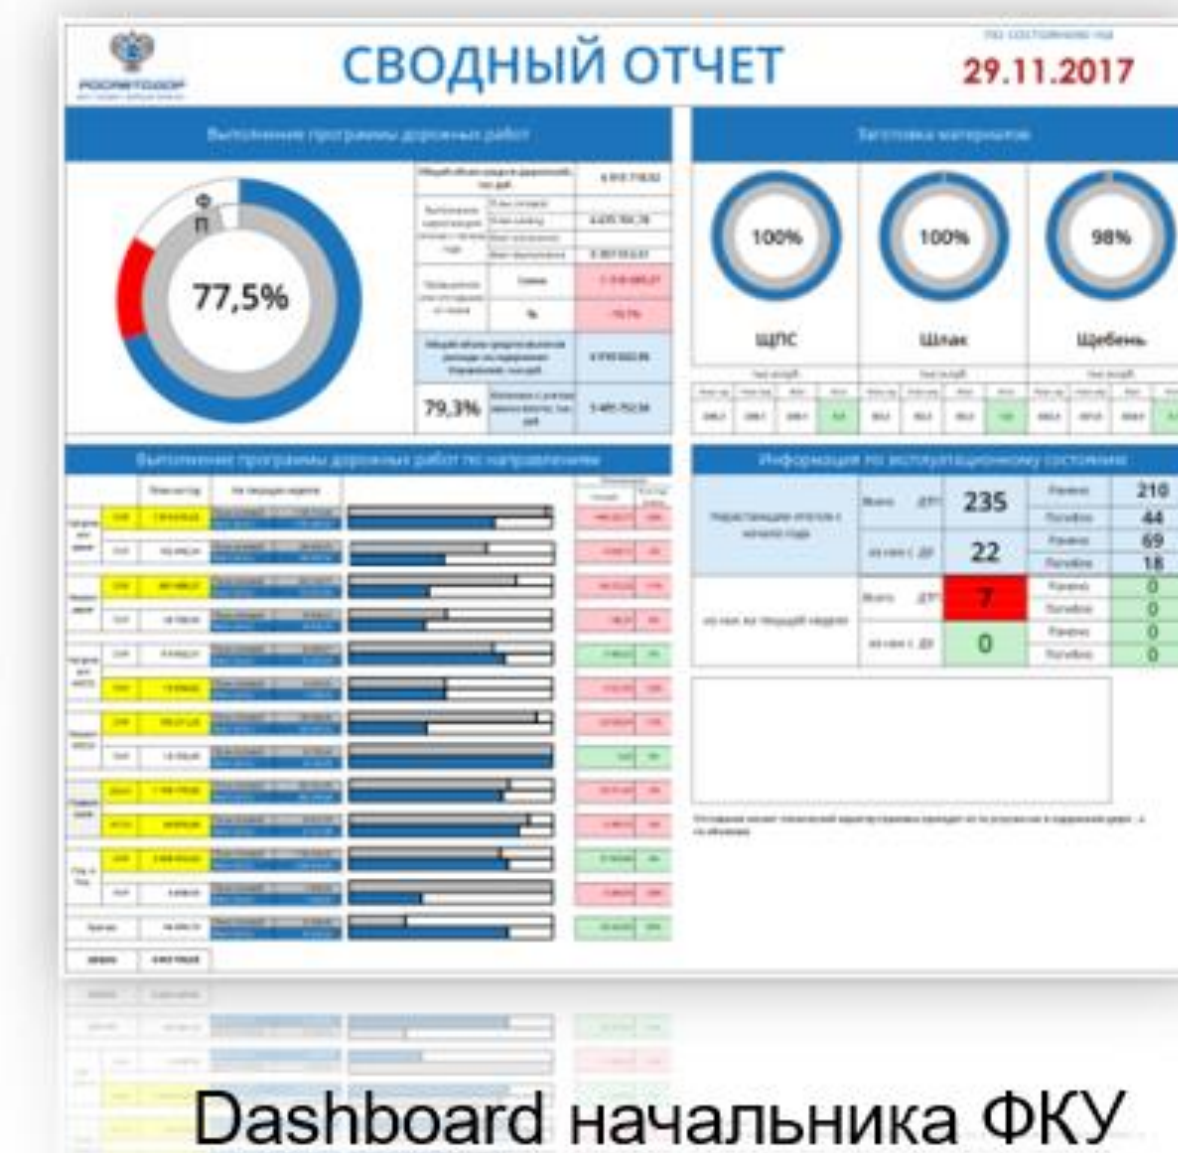

Dashboard начальника ФКУ


A screenshot of a Gantt chart interface. The chart displays multiple horizontal bars representing project tasks and their durations across a timeline. The bars are color-coded, with some in yellow and others in red, likely indicating different statuses or priorities. The interface includes various controls and labels for task management.

Сводный чек-лист

A screenshot of a multi-project Gantt chart. The chart shows a list of projects on the left, each with its own set of task bars. The projects are color-coded, and the bars show their progress over time. The interface is organized and easy to navigate, allowing for the monitoring of multiple projects simultaneously.

Мультипроект

Dashboard начальника ФКУ

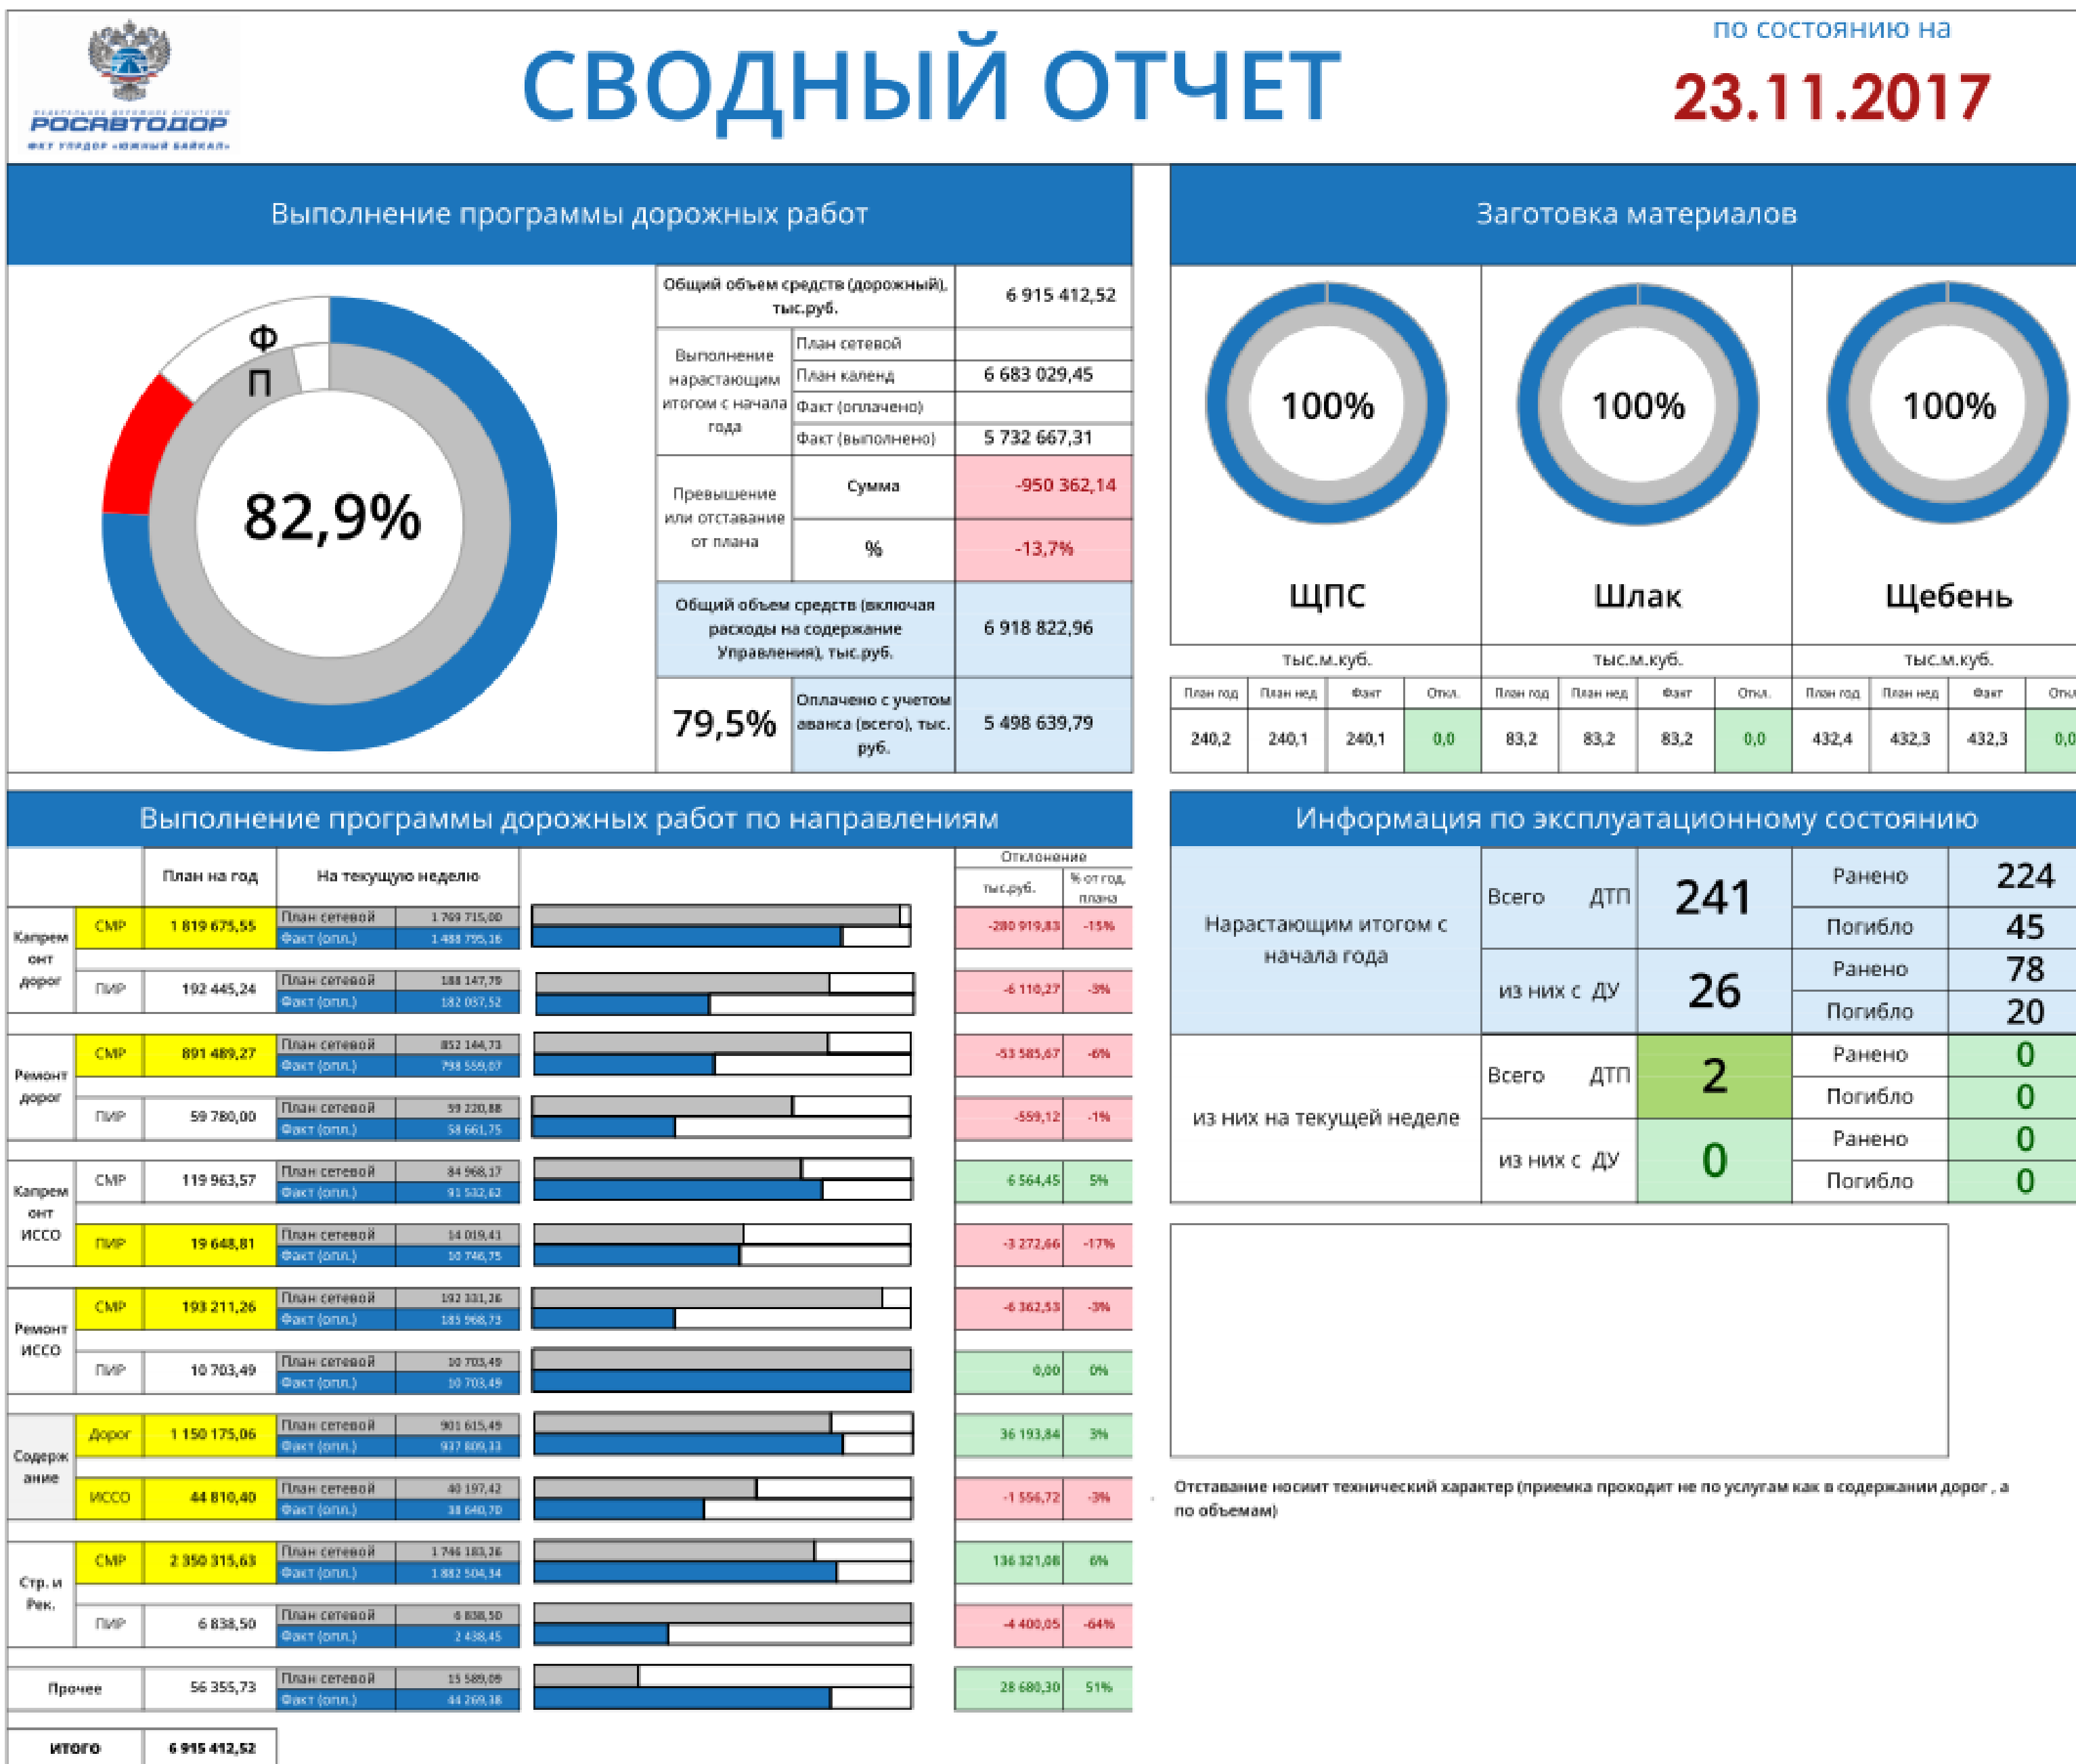

Улан-Удэнская агломерация




	Общая протяженность, КМ
Всего	864,5
Федеральные дороги	128,3
Региональные дороги	226,4
г.Улан-Удэ	242,3
Иволгинский район	35,2
Тарбагатайский район	56,8
Заиграевский район	81,5
Прибайкальский район	93,6

Система контроля БКАД в ФКУ



Система управления проектом БКАД

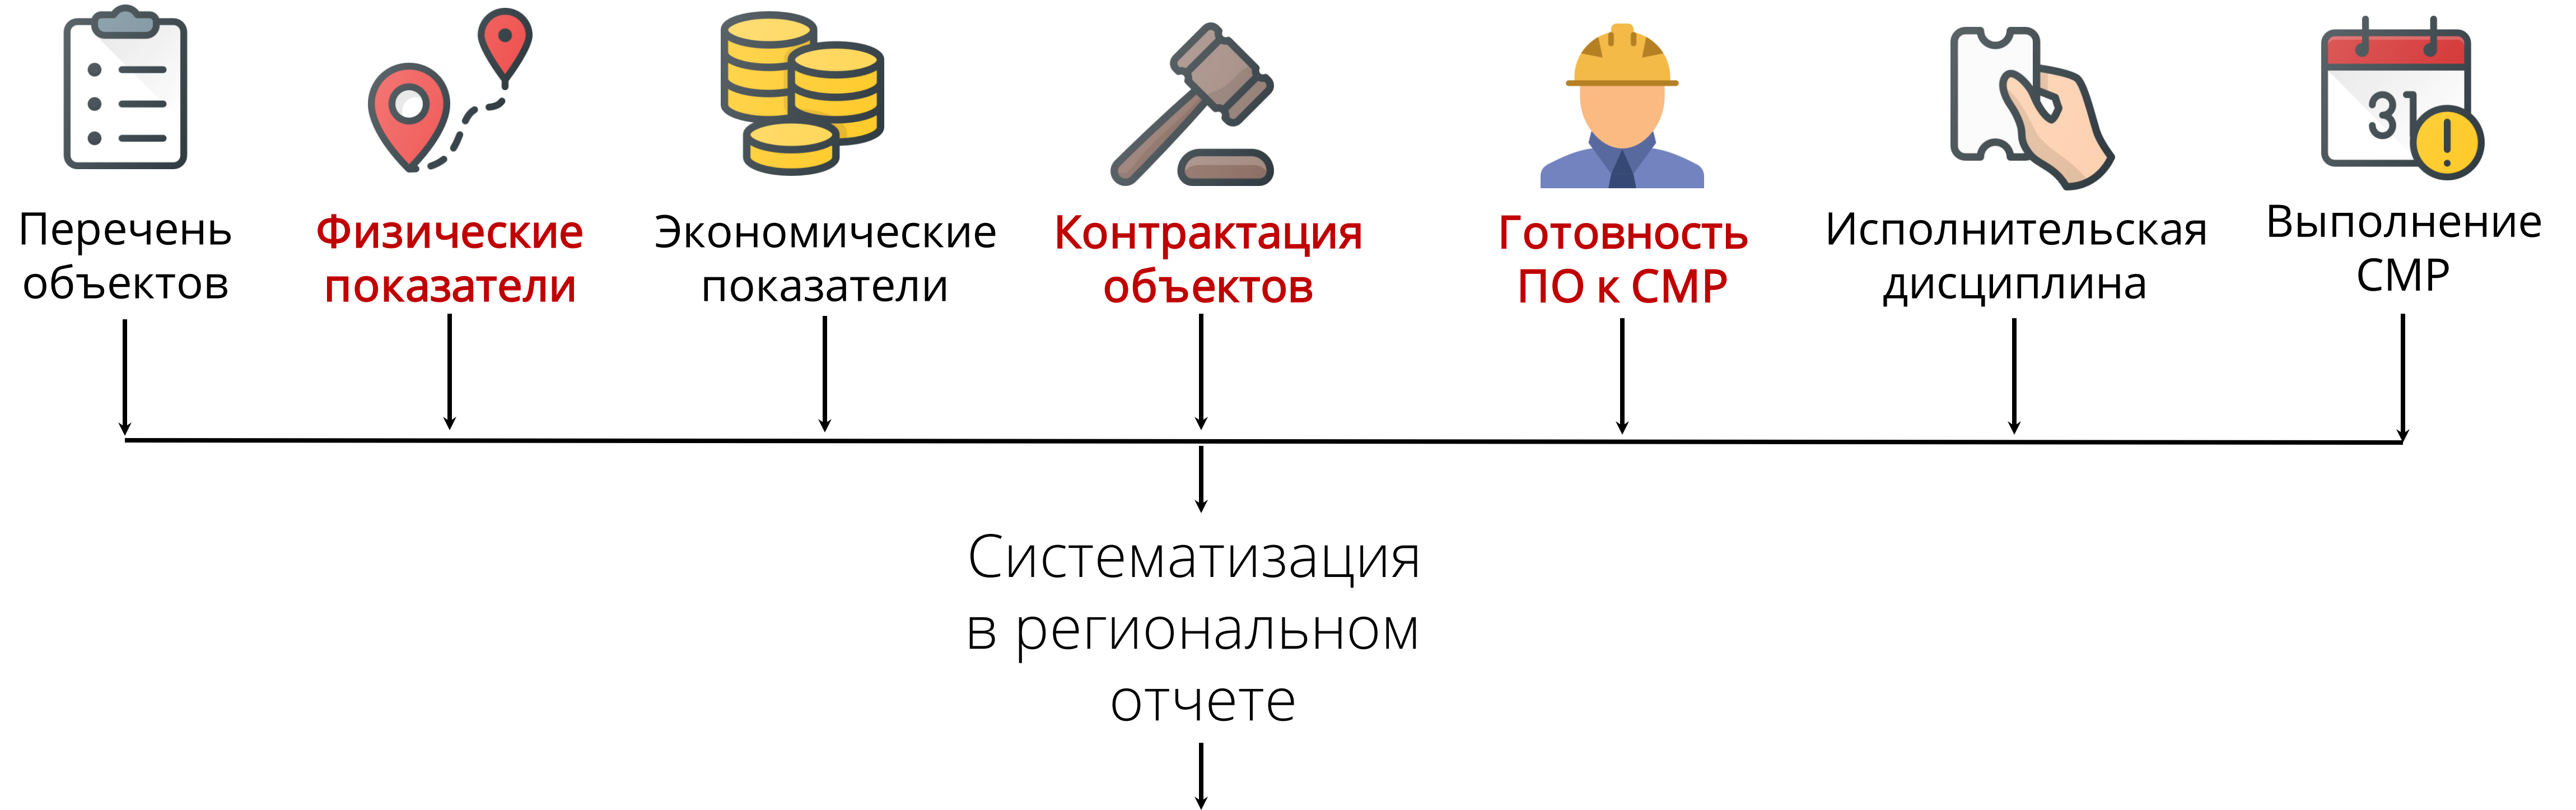


- Структурирование данных в чек-листах
- Глубокая детализация
- Использование инфографики
- Работа с отклонениями

Реестр рисков отслеживаемых ФКУ в рамках реализации национального проекта БКАД



Ошибки в проектной документации

№ п/п	Наименование подрядной организации	Наименование объекта	Дата заключения контракта	Протяженность, км	Лимит, руб.	Проект	Экспертиза	Куратор ФКУ	Комментарий
СМР									
1	Не определен	Повышение уровня обустройства (устройство эл. освещения) км 53+000 – км 58+000 автомобильной дороги Улан-Удэ – Турингаво-Курумдан-Новый Улан		5,000	49 000 000	+	+	Ленкобаев З.В.	
2	Труд	Реконструкция км 230+000 – км 251+000 автомобильной дороги Улан-Удэ – Турингаво-Курумдан-Новый Улан			42 700 000	+	+	Батуев Ч.Д.	
3	Труд	Реконструкция км 271+000 – км 291+000 автомобильной дороги Улан-Удэ – Турингаво-Курумдан-Новый Улан			10 000 000	+	+	Батуев Ч.Д.	
4	Ремстрой	Ремонт км 312+000 – км 325+000 автомобильной дороги Улан-Удэ – Турингаво-Курумдан-Новый Улан			28 792 530	+	не требуется	Ленкобаев З.В.	
5	Не определен	Капитальный ремонт км 16+000 – км 26+000 автомобильной дороги Улан-Удэ – Романска-Чита			1 000 000	+	+	Мальк П.В.	поданы мэт-лы на расторжение 04.02.2019 г. с проектной организацией ООО «Даймондрайв» № 20-р. Запланирован перенос лимитов по СМР 2019 года.
6	ООО "Ремстрой"	Капитальный ремонт км 351+000 – км 354+000 автомобильной дороги Улан-Удэ – Романска-Чита			8 000 000	+	+	Мальк П.В.	
7	ООО "Стройдорстрой"	Капитальный ремонт км 164+300 – км 173+300 автомобильной дороги Романска-Багдарин			85 238 480	+	+	Мальк П.В.	
8	Не определен	Капитальный ремонт км 125+000 – км 130+000 автомобильной дороги Мурзыйбар-Багдара-Кихта			40 000 000	+	+	Калишевская С.Е.	
9	Не определен	Ремонт км 33+000 – км 38+000 автомобильной дороги Улан-Удэ – Николаевский-Тарбагатай-Падолопши-Ойно Кююи		1,000	21 154 400	+	не требуется	Иванов С.В.	
10	Не определен	Капитальный ремонт км 38+000 – км 48+000 автомобильной дороги Улан-Удэ – Николаевский-Тарбагатай-Падолопши-Ойно Кююи			159 000 000	+	+	Иванов С.В.	
11	ООО "Нардванстрой"	Ремонт км 55+000 – км 62+277 автомобильной дороги Улан-Удэ – Заиграво-Кижинга-Хоренск		1,952	17 087 300	+	не требуется	Дамбаев Д.С.	
12	Не определен	Ремонт км 190+000 – км 197+000 автомобильной дороги Улан-Удэ – Заиграво-Кижинга-Хоренск			66 593 850	+	не требуется	Дамбаев Д.С.	
13	Не определен	Ремонт км 0+000 – км 12+600 подъезд от автомобильной дороги Гортоловский мост – Верхние Тальцы – Хоренск к автомобильной дороге Улан-Удэ – Заиграво-Кижинга-Хоренск		12,632	169 005 300	+	не требуется	Калишевская С.Е.	
14	Не определен	Капитальный ремонт км 0+000 – км 4+800 автомобильной дороги Зририк-Нижние Тальцы-Сосновый Бор		4,800	60 000 000	+	-	Алтаева П.В.	ГД срок исполнения 01.02.2019г-000 «РегионПроекта». 26-р. В настоящее время проект и экспертиза не получена
15	Не определен	Строительство км 9+000 – км 10+000 автомобильной дороги Иволгинск-Иволгинский храм			56 800 000	+	+	Дамбаев С.Ж.	

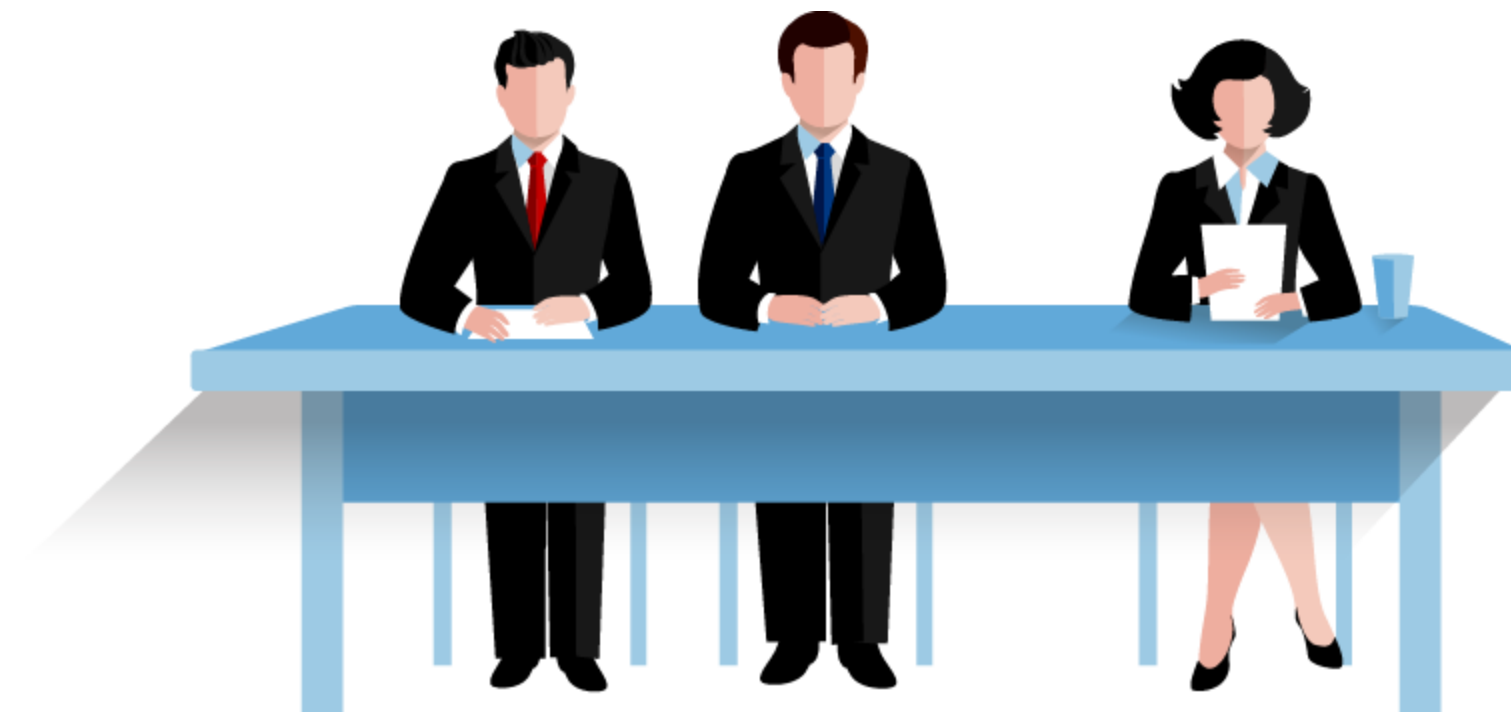

Чек-лист

отслеживает готовность проекта и статус экспертизы (информацию запрашивают и контролируют кураторы ФКУ)

Кураторами ФКУ

ведется рассмотрение проектной документации (выявленные замечания направляются в Минтранс РБ и Мун. заказчику)



Результат: проект прошел гос. экспертизу, а кураторами ФКУ были выявлены замечания.

Позднее проведение торгов

№	Наименование закупки	Электронный аукцион	Внесены ли изменения в аукционный документ	Дата окончания приема заявок	Дата окончания приема заявок	Дата окончания приема заявок	Дата окончания приема заявок	Сумма контракта в руб.	Сумма контракта в руб.	Электронный аукцион (%)	Внесены ли изменения в аукционный документ	Количество заявок от участников	Этап	Подобраны ли торги	Примечания
ФКУ "Возмошанский" (Итого заявок: 52/52)															
1	Выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт автодороги Троицк-Возмошанский-Трубетовый-Судачинское-Озеро-Кочин, км 21 - км 31 в Троицком районе Республики Бурятия			13.01.19	30.07			541 837 890,00	159 000 000,00	0,00			Выполнен	Стор	http://www.zakupki.gov.ru/epz/lot/view.do?contractLotId=5058266
2	Выполнение работ по объекту: Строительство инфраструктуры автодороги Троицк-Туртуяново-Пурчаная-Еловый Угол, км 13 км 19 (с Приказа) в Троицком районе Республики Бурятия			13.01.19	Февраль			39 000 000,00	39 000 000,00	0,00			Выполнен	Стор	http://www.zakupki.gov.ru/epz/lot/view.do?contractLotId=5058267
3	Выполнение работ по объекту: Строительство автодороги Липовинское-Липовинский Угол, км 6-11 в Буряцком районе Республики Бурятия			13.01.2019	Февраль			104 114 494,00	55 712 250,00	0,00			Выполнен	Стор	http://www.zakupki.gov.ru/epz/lot/view.do?contractLotId=5058268
4	Выполнение работ по объекту: Строительство автодороги Троицк-Романово-Зель, км 18 - км 24 в Буряцком районе Республики Бурятия			28.11.19	30.07			120 000 000,00	500,00	0,00			Выполнен	Стор	http://www.zakupki.gov.ru/epz/lot/view.do?contractLotId=5058269
5	Выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт автодороги Курган-Ильинское-Уланов-Сосновый Бор, км 4 км 49/11 в Буряцком районе Республики Бурятия			28.11.19	март			127 500 000,00	2 500 000,00	0,00			Выполнен	Стор	http://www.zakupki.gov.ru/epz/lot/view.do?contractLotId=5058270
6	Выполнение работ по ремонту автодороги Троицк-Троицк-Возмошанский-Трубетовый-Судачинское-Озеро-Кочин, км 21 - км 31 в Троицком районе Республики Бурятия			30.11.19	30.11.19	03.03.19		64 674 980,10	1 000 000,00	324 989,90			В торгах		2 Заявки отменили 18.02.2019 (ранее заявки отменены) Итоговый протокол отменен в ИС
7	Выполнение работ по ремонту автодороги "Слободки" автодороги Курган-Ильинское-Уланов-Сосновый Бор, км 4 км 49/11 в Буряцком районе Республики Бурятия			30.11.19	30.11.19	03.03.19		104 400 472,00	12 000 000,00	0,00			Назначены конкурсы	ООО "АРТ-КОМ"	(Заявка ООО Байкал-Стор отменена, ООО - Рубинский - Претензия не рассмотрена)
8	Выполнение работ по объекту: Строительство автодороги Курган-Ильинское-Уланов-Сосновый Бор, км 4 км 49/11 в Буряцком районе Республики Бурятия			30.11.19	30.11.19	03.03.19		65 402 400,00	40 000 000,00	0,00			Назначены конкурсы	ООО "ВЕРИКОМ"	
9	Выполнение работ по ремонту автодороги Троицк-Туртуяново-Пурчаная-Еловый Угол, км 13 - км 19 (с Приказа) в Буряцком районе Республики Бурятия			30.11.19	30.11.19	03.03.19		279 597 595,00	65 595 594,00	0,00			Назначены конкурсы	ООО "АРТ-КОМ"	(Заявка ООО Байкал-Стор отменена)
10	Выполнение работ по реконструкции автодороги Троицк-Туртуяново-Пурчаная-Еловый Угол, км 20 - км 24 в Буряцком районе Республики Бурятия (1, 2, 3, 4, 5 км)			09.07.17	20.07.17	18.08.17	08.09.17	1 719 700 399,00	41 750 000,00	65 577 592,00	100%	-3	Конкурс назначен	АО "РПЦ"	http://www.zakupki.gov.ru/epz/lot/view.do?contractLotId=5058271
11	Выполнение работ по ремонту автодороги Троицк-Туртуяново-Пурчаная-Еловый Угол, км 10 - км 13 - км 19 (с Приказа) в Буряцком районе Республики Бурятия			10.08.18	17.08.18	18.09.18	17.09.18	2 139 222 465,51	9 184 500,00	60 778 426,68	75%	-1	Конкурс назначен	АО "РПЦ"	http://www.zakupki.gov.ru/epz/lot/view.do?contractLotId=5058272
12	Выполнение работ по ремонту автодороги Троицк-Туртуяново-Пурчаная-Еловый Угол, км 10 - км 13 - км 19 (с Приказа) в Буряцком районе Республики Бурятия			16.11.18	18.11.18	09.01.19	14.01.19	20 948 597,35	145 945,45	128%		5	Конкурс назначен	ООО "КОМСТРОЙ"	http://www.zakupki.gov.ru/epz/lot/view.do?contractLotId=5058273
13	Капитальный ремонт автодороги Троицк-Романово-Зель, км 18/1 - км 24/1 в Буряцком районе Республики Бурятия			31.03.18	20.04.18	11.07.18	20.07.18	77 709 611,76	8 000 000,00	2 729 758,30	55%	0	Конкурс назначен	ООО "РЕМСТРОЙ"	http://www.zakupki.gov.ru/epz/lot/view.do?contractLotId=5058274
14	Выполнение работ по содержанию ремонта автодороги Романово-Зель, км 18/1 - км 24/1 в Буряцком районе Республики Бурятия			11.03.17	27.03.17	18.11.17	17.11.17	289 988 470,00	93 239 490,00	0,00	100%	-1	Конкурс назначен	ООО "СТРОЙ-КОМ"	http://www.zakupki.gov.ru/epz/lot/view.do?contractLotId=5058275



Чек-лист по торгам

отслеживает все возможные контрольные точки по торгам, а также дается экспертная оценка куратором ФКУ о рисках несвоевременного заключения контрактов

(информация предоставляется сотрудниками ФКУ на проектном офисе)

Представитель РАГЗ


на каждом проектном офисе присутствует представитель РАГЗ и дает консультации муниципальным заказчикам.

Нехватка техники

Информация по асфальтоукладочным комплексам								
№	Подрядчик	Наименование техники	Марка/Модель	Производительность, т/час	Год выпуска	Наличие 3D оборудования	Ширина укладки, метров	Возможность использования для работ в рамках Агломерации г.Улан-Удэ (период месяц)
1	Промстроймеханизация	Volvo	Titan 5820	600	2007	нет	8	май-сентябрь
2	ТСК	XCMG	RP952	700	2008	да	8	май-октябрь
3		XCMG	RP451L	240	2009	нет	4	май-октябрь
4		Demag	135C	700	1999	нет	4	май-октябрь
5	РегионСтрой	Volvo	Titan5820	600	2009	да	5,5	Ответ будет 17.04.2017
6	Дорстройсервис	Volvo	Titan 5820	600	2007	нет	8	май-октябрь
7		VOGELE	VOGELE	900	2001	нет	5	май-октябрь
8	Ремстрой	Sumitomo	HA-60C	400	2002	да	6	май-октябрь
9		Sumitomo	HB31C-2	150	1995	да	3,5	май-октябрь
10	Мехколонна 184	Sumitomo	HA-60C	400	2008	нет	4,5	июнь-октябрь
11	Легион	MTSUBISHI	MF61D	400	2011	нет	6	май-октябрь
12		HANTA	F2040C	150	2007	нет	4	май-октябрь
13	Никас	Volvo	Titan 5820	600	2011	нет	8	октябрь-ноябрь
14	Инженерно-строительные технологии	Отсутствует						
15	Монолит	Отсутствует						
16	Сибсервис (Мех.колонна1)	Отсутствует						
17	Стройсервом	Отсутствует						
18	СтатусСиб	Нет возможности						
19	Главная дорога	Нет возможности						
20	Магистраль	Нет возможности						
21	Восток	Нет возможности						
22	Бурятавтодор	Нет возможности						
23	Труд	Нет возможности						
Итого			13					

Чек-лист по технике

Кураторы ФКУ проводят анализ наличия техники и возможность ее использования на территории агломерации.

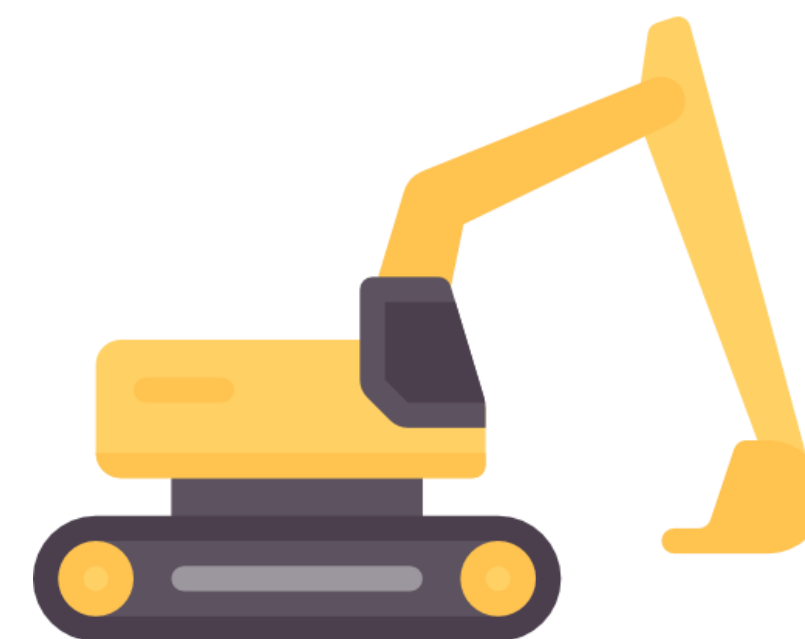

Контроль техники кураторами ФКУ

Кураторы ФКУ в результате выездов собирают информацию о местонахождении техники подрядных организаций. (Предоставляет эту информацию на проектном офисе)

Срыв поставки сроков материалов (отсутствие сертификатов)

Информация по выпуску материалов в пределах Республики Бурятия																													
№ п/п	Наименование карьера	Потребность на Аппромерацию												Потребность на действующие контракты								Суточная мощность выпуска		Исп-во техники задействованной на производство продукции, характеристика (производительная мощность, марка/модель и тп.)	Прочность/морозостойкость материала				
		выпуск в стрит.сезон 2017г.		май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	выпуск в стрит.сезон 2017г.				Федеральные дороги	Региональные дороги	Гражданское строительство	Прочие												
		щебня, тыс.м3	песч., тыс.м3	щебня, тыс.м3	песч., тыс.м3	щебня, тыс.м3	песч., тыс.м3	щебня, тыс.м3	песч., тыс.м3	щебня, тыс.м3	песч., тыс.м3	щебня, тыс.м3	песч., тыс.м3					щебня, тыс.м3	песч., тыс.м3	щебня, тыс.м3	песч., тыс.м3	щебня, тыс.м3	песч., тыс.м3						
1	Северное-1 ООО "Солнеч"	28	13	0	2	0	2	2	0	2	0	12	0	12	9	44	76	3	2							0,40	0,40	Дробильная установка - 1 шт Бульдозер - 1 шт Экскаватор - 1 шт Самосвал - 2 шт Полуприч - 1 шт.	1200 / F50
2	Нашицы	60,47	16,00	5,72	1,00	5,72	1,00	5,72	1,00	5,72	1,00	5,72	1,00	5,72	1,00	0	0	16,153	10,00	0	0	0	0	0	0	390,00	90,00	ДСК - ТИАН	1200 / F50
3	Горняк	282	108	47	18	47	18	47	18	47	18	47	18	47	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	69	3 комплекта дробильно-сортировочных (Дробилка щебеная СМ16Д, СМД-1084-Р, конусная КСД1200, КСД600, Гранит ПКС43, Экскаватор ИТЛАН 2104С, Doosan-бульдозер T130).	1200 / F300

Чек-лист по материалам

Кураторы ФКУ собирают информацию по заготовке материалов.
(Предоставляют информацию на проектном офисе)



Проверка сертификатов у поставщиков

Кураторы ФКУ проверяют наличие сертификатов у поставщиков материалов.

(Предоставляет эту информацию на проектном офисе)

Наложение работ с объектами сетевых организаций

№	Организация	Улица/Местоположение	Сроки проведения работ в 2017 году	Перечень автодорог (улиц) с указанием км (адрес объекта в границах агломерации) входящих в состав агломерации	Протяженность автодороги (улицы) в пределах агломерации и площадь покрытия	
					км	кв.м
Автомобильные дороги местного значения (улицы)						
МО ГО "Город "Улан-Удэ"						
1	ТГК-14	ТК28-1 до Комсомольская №24	24.04-25.05.	Ремонт дороги по ул. Октябрьская (от ул. Н. Петрова до ул. Комсомольская)	1,30	11 700,00
2		ТК32-4 до ТК32-4-1 Комсомольская №7, 9а	24.04-26.05.			
3		ТК38А-4 до ТК38А-8 Комсомольская 1, Вакарина1	10.05-30.06.			
4		ТК10-13-1 до административного здания Октябрьская 2	26.04-10.05.			
5		ТК10-13 до ТК10-13-1, Октябрьская 2	26.04-26.05.			
6	Водоканал	Октябрьская 15	-			
7	ТГК-14	ТК22-18а до Гагарина 44	27.04-17.05	Ремонт автодороги перекресток пр. 50-летия Октября и ул. Гагарина	0,15	1 050,00
8		ТК24-16 Гагарина 73Б	27.04-18.05			
9	ТГК-14	ТК22-18а до Гагарина 44	27.04-17.05	Ремонт автодороги перекресток ул. Гагарина и ул. Добролюбова	0,20	1 400,00
10		ТК24-16 Гагарина 73Б	27.04-18.05			



Планы работ сетевых организаций
 Кураторы ФКУ собирают информацию о планах проведения работ сетевых организаций. Контролируют предотвращение наложения работ.
 (Предоставляют информацию на проектом офисе)

Взаимодействие с представителями сетевых организаций
 (Приглашение и совместная отработка рисков с представителями сетевых организаций)

Инструменты ФКУ в рамках реализации БКАД

Чек-листы по готовности ПО

Сводный чек-лист

Dashboard

№	Наименование объекта	Дата заключения контракта	Планируемая стоимость, руб.	Проект	Эксплуатация	Контракт ФКУ	Комментарий
1	Не определен		0.000	49 000.000	-	Ремонт 3.0	
2	Труд			49 700.000	-	Безопас Ч.Д.	
3	Труд			10 000.000	-	Безопас Ч.Д.	
4	Ремстрой						
5	Не определен						
6	ООО "Ремстрой"						
7	ООО "Строительный"						
8	Не определен						
9	Не определен						
10	Не определен						
11	ООО "Нарваин-строй"						
12	Не определен						
13	Не определен						
14	Не определен						
15	Не определен						

№ п/п	Наименование подрядной организации	Наименование объекта	Дата заключения контракта	Планируемая стоимость, руб.	Проект	Эксплуатация	Контракт ФКУ	Комментарий
1	Не определен	Капитальный ремонт км 16+000 - км 18+000 автомобильной дороги Улан-Удэ - Рямчата						
2	Труд	Ремонт км 230+000 - км 251+000 автомобильной дороги Улан-Удэ - Тургутаво - Курumkan - Новый Улан						
3	Труд	Ремонт км 271+000 - км 291+000 автомобильной дороги Улан-Удэ - Тургутаво - Курumkan - Новый Улан						
4	Ремстрой	Ремонт км 312+000 - км 329+000 автомобильной дороги Улан-Удэ - Тургутаво - Курumkan - Новый Улан						
5	Не определен	Капитальный ремонт км 16+000 - км 18+000 автомобильной дороги Улан-Удэ - Рямчата						
6	ООО "Ремстрой"	Капитальный ремонт км 201+000 - км 211+000 автомобильной дороги Улан-Удэ - Рямчата						
7	ООО "Строительный"	Капитальный ремонт км 164+000 - км 174+000 автомобильной дороги Рамонка - Ба						
8	Не определен	Капитальный ремонт км 125+000 - км 135+000 автомобильной дороги Мультишарь - К. Келга						
9	Не определен	Ремонт км 33+000 - км 38+000 автомагистраль Улан-Удэ - Никольский - Тарбагатай - Подпорожье - Окино - Кичиги						
10	Не определен	Капитальный ремонт км 38+000 - км 48+000 автомобильной дороги Улан-Удэ - Никольский - Тарбагатай - Подпорожье - Окино - Кичиги						
11	ООО "Нарваин-строй"	Ремонт км 55+000 - км 62+000 автомагистраль Улан-Удэ - Заиграево - Кичиги - Хол						
12	Не определен	Ремонт км 190+000 - км 197+000 автомобильной дороги Улан-Удэ - Заиг. Кичиги - Хол						
13	Не определен	Ремонт км 0+000 - км 12+000 попутной автомобильной дороги Горголюкский - Восток - Тальцы - Холонго - автомобильная Улан-Удэ - Заиграево - Кичиги - Хол						
14	Не определен	Капитальный ремонт км 0+000 - км 10+000 автомобильной дороги Звонки - Рамонка - Сосновый Бор						
15	Не определен	Строительство км 0+000 - км 10+000 автомобильной дороги Идугинск - Идугинск						

Информация по асфальтоукладочным комплексам									
№	Подразник	Наименование техники	Марка/Модель	Производительность, т/час	Год выпуска	Наличие 3D оборудования	Ширина укладки, метров	Возможность использования для работ в рамках Агломерации г. Улан-Удэ (первый месяц)	Комментарий
1	Промстроймеханизация	Volvo	Titon 5820	600					
2	ТСК	XCMG	RP952	700					
3		XCMG	RP451L	240					
4	РегионСтрой	Demag	135C	700					
5		Volvo	Titon 5820	600					
6	Дорстройсервис	Volvo	Titon 5820	600					
7		VOGELE	VOGELE	900					
8	Ремстрой	Sumitomo	HA-60C	400					
9		Sumitomo	HB31C-2	150					
10	Мехколonna 184	Sumitomo	HA-60C	400					
11	Летнон	MITSUBISHI	MF61D	400					
12		HANTA	F2040C	150					
13	Нивас	Volvo	Titon 5820	600					
14	Инженерно-строительные технологии	Отсутствует							
15	Монолит	Отсутствует							
16	Сибсервис (Мех.колonna)	Отсутствует							
17	Стройсервисом	Отсутствует							
18	СтатусСиб	Нет возможности							
19	Главная дорога	Нет возможности							
20	Магистраль	Нет возможности							
21	Восток	Нет возможности							
22	Бурятавтодор	Нет возможности							
23	Труд	Нет возможности							
Итого				13					

Чек-лист по торгам

Чек-лист объектов

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 26.02.2019

0,00%

План (год), тыс. руб. 929774158,8

План (календ.), тыс. руб. 0

Факт (выполн.), тыс. руб. 0

Факт (оплач.), тыс. руб. 0

Отклонение от календарного плана, тыс. руб. 0,00

Отклонение от календарного плана, % 0,00%

Наименование	Всего	На раб.	В торгах	Закл.
Бурятрегионалтодор				
г. Улан-Удэ				
Прибайкальский				
Тарбагатайский				
Заиграевский				
Иволгинский				
ФКУ				

Наименование	Посещений	Замечания	
		Устр.	Не устр.
Бурятрегионалтодор	с начала года		
г. Улан-Удэ	с начала года		
Прибайкальский	с начала года		
Тарбагатайский	с начала года		
Заиграевский	с начала года		
Иволгинский	с начала года		
ФКУ	с начала года		

Взаимодействие с разработчиками СОУ «Эталон»



Добавление функционала по готовности подрядных организаций (Базы, АБЗ, Карьеры, Техника, Специалисты, Дробление)

Доработка возможности вывода и построения сводной информации по определенным показателям

Доработка возможностей для построения наглядной инфографики

Создание базы специалистов и дорожной техники

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
